



Объединение административно-технических инспекций города Москвы

**О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО
РЕМОНТУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО
ПОКРЫТИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ
СЕТИ И ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА**



ЛАБОРАТОНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ (переделка объектов)

Округ	Кол-во объектов, где некачественно выполнены работы	Объём выполненного ремонта (тыс.кв.м.)	Требуемое кол-во кернов	Отобрано кернов (шт.)	Результаты не соответствуют нормативу (шт.)	Требуемый объем переделки (по лабораторным испытаниям ОАТИ) (тыс.кв.м)
ГКУ КМ	2	30,2	13	13	4	8
ЦАО	6	68,3	30	30	8	16
САО	10	151,0	65	65	26	52
СВАО	9	155,8	66	66	16	32
ВАО	7	54,3	23	23	12	24
ЮВАО	3	30,4	27	30	5	10
ЮАО	10	122,7	52	54	17	33
ЮЗАО	4	40,0	16	17	7	14
ЗАО	6	119,3	51	51	12	24
СЗАО	7	113,5	47	48	16	32
ЗелАО	3	52,0	24	24	3	6
ВСЕГО	67	937,5	414	421	126	251




ХОД РАБОТ ПО ПЕРЕДЕЛКЕ НЕКАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННЫХ УЧАСТКОВ

Округ	Объекты, где были некачественные пробы		Переделка покрытия		На контроле (на 24.07.2012г.)	
	кол-во	Требуемая площадь переделки (тыс.кв.м)	кол-во объектов, где переделка выполнена в требуемом объеме	Площадь выполненного ремонта по переделке (тыс.кв.м.)	кол-во объектов	Площадь ремонта (тыс.кв.м.)
ГКУ КМ	2	8	2	8	0	0
ЦАО	6	16	3	10,9	3	5,1
САО	10	52	1	4	9	48
СВАО	9	32	5	10	4	22
ВАО	7	24	3	8	4	16
ЮВАО	3	10	1	6	2	4
ЮАО	10	33	3	12,3	7	20,7
ЮЗАО	4	14	4	14	0	0
ЗАО	6	24	3	14	3	10
СЗАО	7	32	0	12	7	20
ЗелАО	3	6	1	4	2	2
ВСЕГО	67	251	26	103,2	41	147,8




ХОД РАБОТ ПО ПЕРЕДЕЛКЕ НЕКАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННЫХ УЧАСТКОВ (на 24.07.2012г.)

➤ По заказчикам

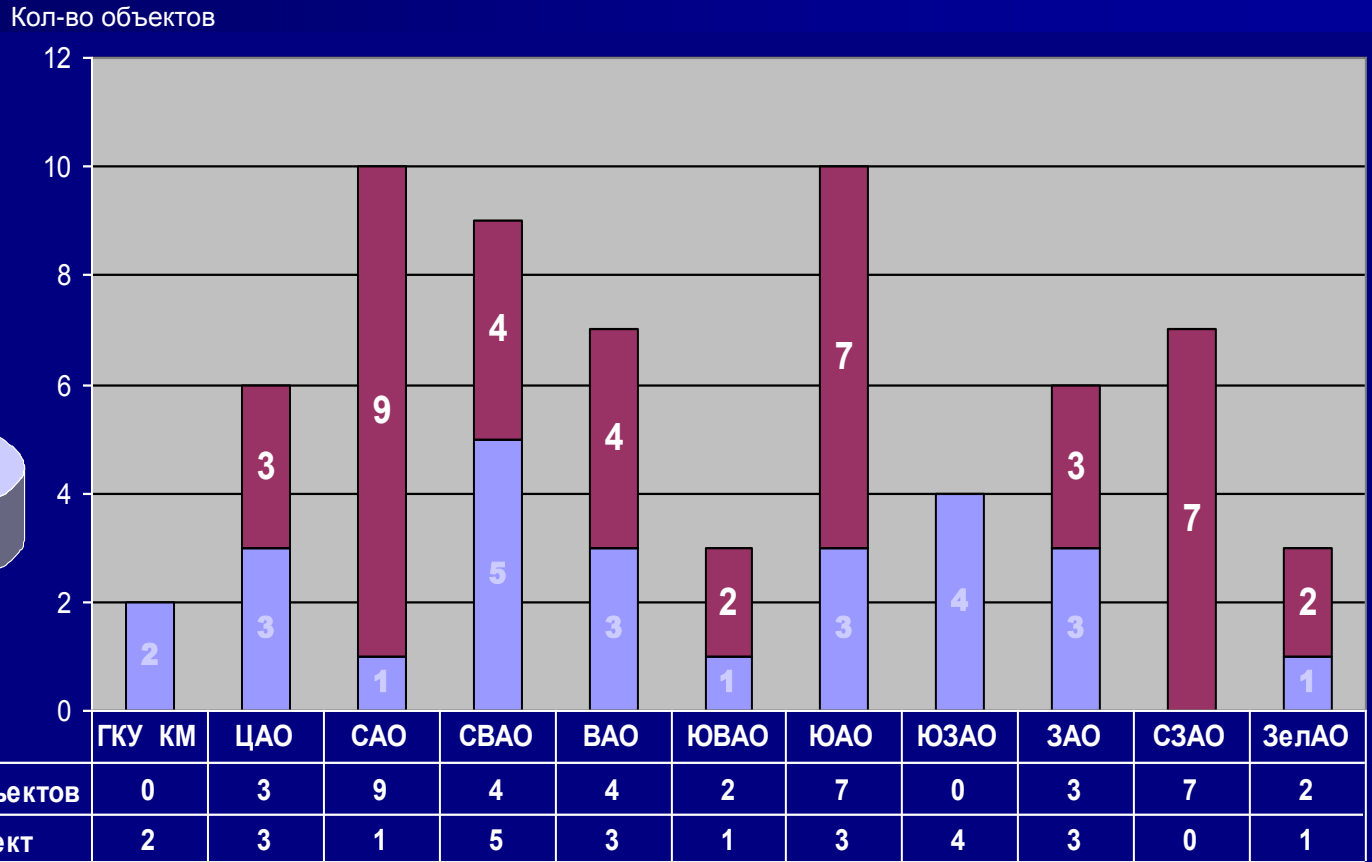

➤ По городу:



РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ В СЕЗОНЕ 2012 ГОДА (на 24 июля)



Заказчик	кол-во объектов лабораторного контроля	кол-во объектов с нарушениями		
		всего	за последнюю неделю	Перечень объектов
ГБУ КМ	45	2		
ЦАО	49	8	2	пр-д Девичьего Поля (ООО "Аркопласт"); Пресненский Вал ул. (ЗАО "Компаньон");
САО	63	13	3	Приорова ул. (ООО "Благоустройство территории"); 1-я Песчаная ул. (ООО "Дорпроектстрой"); 3-й Новомихалковский пр-д (ООО "АвтодорСтройП")
СВАО	52	9		
ВАО	57	7		
ЮВАО	56	3		
ЮАО	67	11	1	Нахимовский пр-т (ООО "ЦентрДорСтрой")
ЮЗАО	23	4		
ЗАО	61	6		
СЗАО	79	7		
ЗелАО	9	3		
Итого	561	73	6	



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ

Заказчики	кол-во объектов	выполнены запланированные объемы работ	Приемка объектов			В работе	Меры ОАТИ (кол-во штрафов)		
			предъявлено заказчиками	принято	не принято (имеются замечания)		с начала сезона		в т.ч. за последнюю неделю
							кол-во	сумма	
ГКУ КМ	293	179	111	94	17	25	56	600	5
ЦАО	217	68	40	25	15	34	63	1290	2
САО	185	97	48	29	19	29	63	2160	4
СВАО	162	83	55	40	15	38	67	930	5
ВАО	198	100	41	31	10	29	43	410	7
ЮВАО	106	66	56	38	18	13	43	420	6
ЮАО	184	153	89	68	21	31	74	1590	9
ЮЗАО	228	178	75	70	5	12	37	890	2
ЗАО	76	58	49	42	7	17	43	650	3
СЗАО	226	134	63	39	24	36	79	1620	3
ЗелАО	39	33	14	14	0	6	12	310	2
ВСЕГО	1914	1149	641	490	151	270	580	10870	48



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ

% принятых объектов от числа выполненных объектов

